

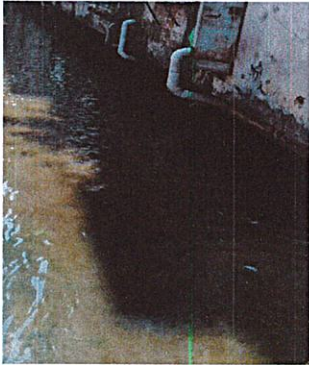


附件1

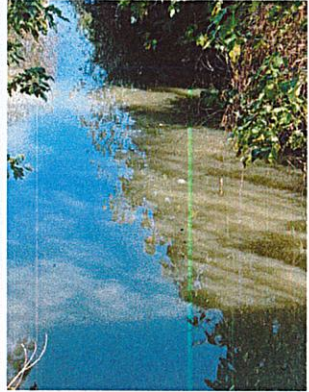

2024年兴宁市县级城市建成区黑臭水体治理进展情况表

填报单位（盖章）： 填报人： 联系电话：0753-3320735 日期：2024.08.13

序号	地级市	县级市	黑臭水体编号	黑臭水体名称	整治前黑臭等级（轻度、重度）	整治工程项目名称	具体情况（简述施工进度情况）	整治工程总投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年累计完成投资（万元）	2024年省级专项资金计划（万元，截至当月）	2024年省级专项资金实际使用（万元，截至当月）	长度/面积（km/km²）	计划完成年份	本月上旬水体影像资料（上中、下、游各一张）	本月中旬水体影像资料（上中、下、游各一张）	本月下旬水体影像资料（上中、下、游各一张）	本月水质监测数据（氨氮、溶解氧、透明度）	沿河排水户数	沿河排水许可核发数量	整治进展（未制定方案、已制定方案、项目前期、项目已开工、完成整治工程、初见成效、长制久清）
1	梅州市	兴宁市	44000581	东排沟黑臭水体整治	轻度	兴宁市环境综合治理与修复项目	已完成整治	16187.95	0	0	0	0	长度4.2km	已完成				透明度40，溶解氧5.6，氨氮1.93	0	0	长制久清
2	梅州市	兴宁市	44000581	东排沟黑臭水体整治	轻度	兴宁市东排沟流域局部污水治理工程	已完成黑臭水体整治，长制久清措施中的兴宁市东排沟流域局部污水治理工程施工总进度完成30%	610.11	610.11	0	0	0	长度4.2km	已完成				透明度40，溶解氧5.6，氨氮1.94	0	0	长制久清

备注：每月5日前填写报送（通过粤政易发送盖章扫描版和可编辑电子版）。



序号	地级市	县级市	黑臭水体编号	黑臭水体名称	整治前等级（轻度、重度）	整治项目名称	具体情况（简述施工进度情况）	整治总投资（万元）	2024年计划投资（万元）	2024年累计完成投资（万元）	2024年省级专项资金计划（万元，截至当月）	2024年省级专项资金实际使用（万元，截至当月）	长度/面积（km/km²）	计划完成年份	本月上旬水体影像资料（上中、下、游各一张）	本月中旬水体影像资料（上中、下、游各一张）	本月下旬水体影像资料（上中、下、游各一张）	本月水质监测数据（氨氮、溶解氧、透明度）	沿河排水户数	沿河排水许可证核发数量	整治进展（未制定方案、已制定方案、项目前期、项目已开工、完成整治工程、初见成效、长制久清）
1	梅州市	兴宁市	44000617	西排沟	轻度	兴宁市江水质综合整治项目一期	对城区西进生态排沟进行护岸、护坡、沿河污水管网等工程项目建设。已完工。	700	200	200	0	0	2km/0.012km²	已完成				透明度60，溶解氧6.8，氨氮1.22	0	0	已完成初见成效评估工作

备注：每月5日前填写报送（通过粤政易发送盖章扫描版和可编辑电子版）。
